

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	25/11/2022
Obra:	Obra reforma da Creche Municipal Olga Ferreira Duarte
Endereço:	Rua Agostinho Lengruber, nº 420, Bairro Boa Ideia, no Município do Carmo-RJ
Empresa:	R.H, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART - 12435996
Numero do contrato:	0520/2022
Numero da tomada de preço:	0007/2022
Numero da ordem de serviço:	002/2022
Prazo:	04 meses
Início:	26/09/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	26/01/2023
Valor:	R\$ 153.475,33
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	R\$ 54.140,23 (Primeira Medição – 04/11/22)
Percentual executado:	35,27%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 309/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	RRT - 12600510
Tipo de recurso:	Recurso Próprio / SME

CARMO, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a


SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA



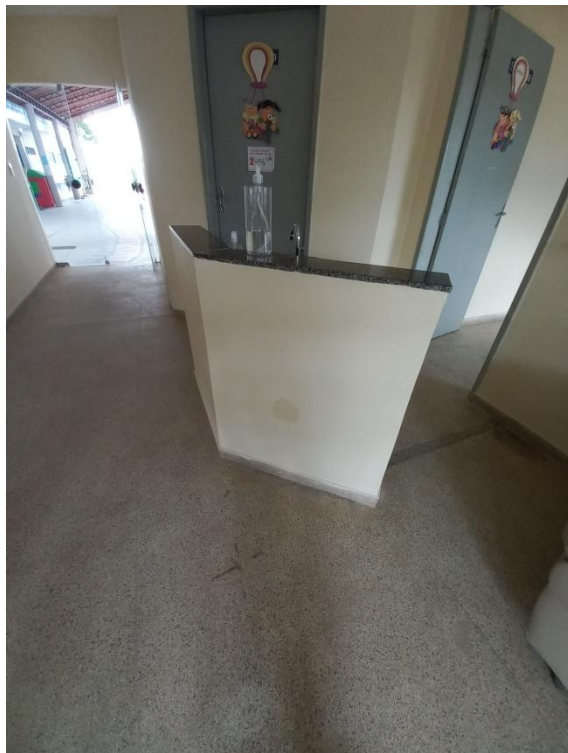





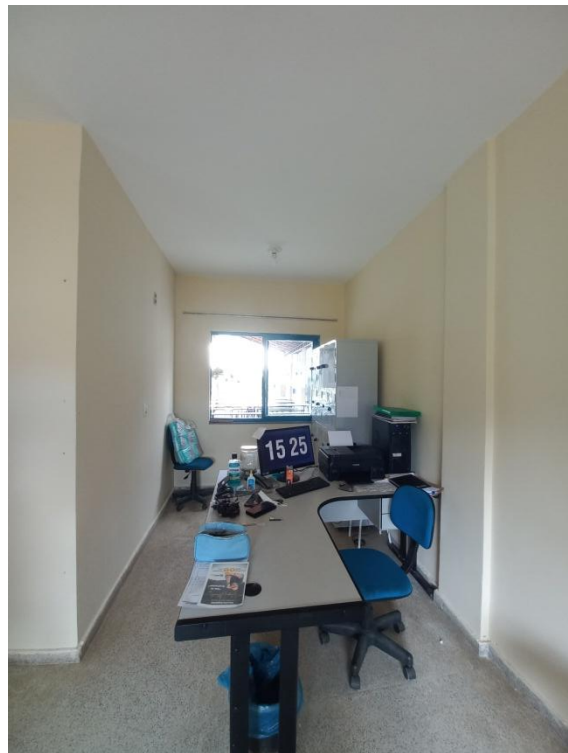













P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA

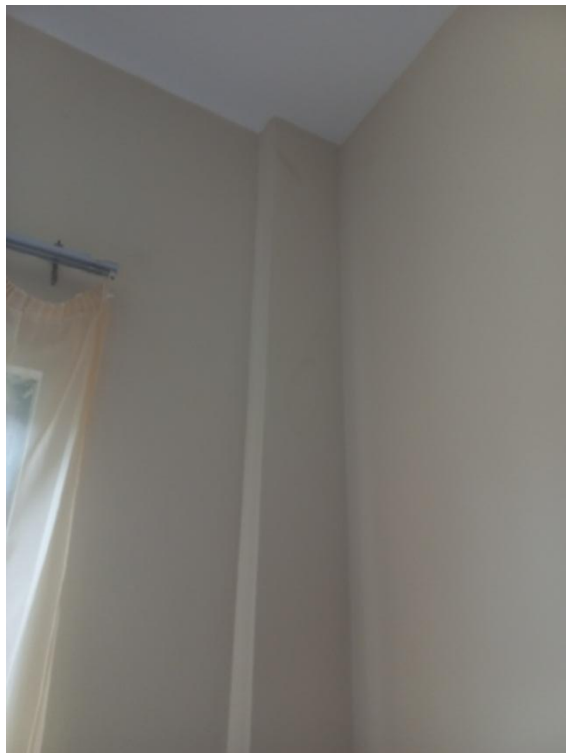






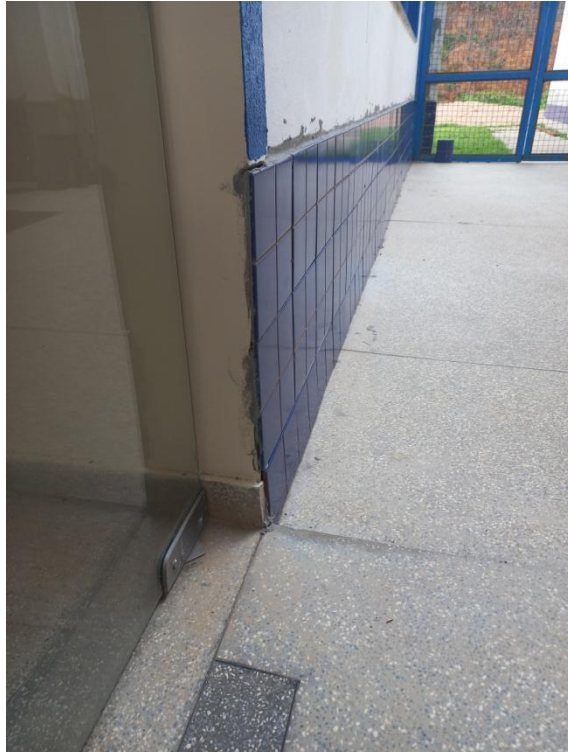



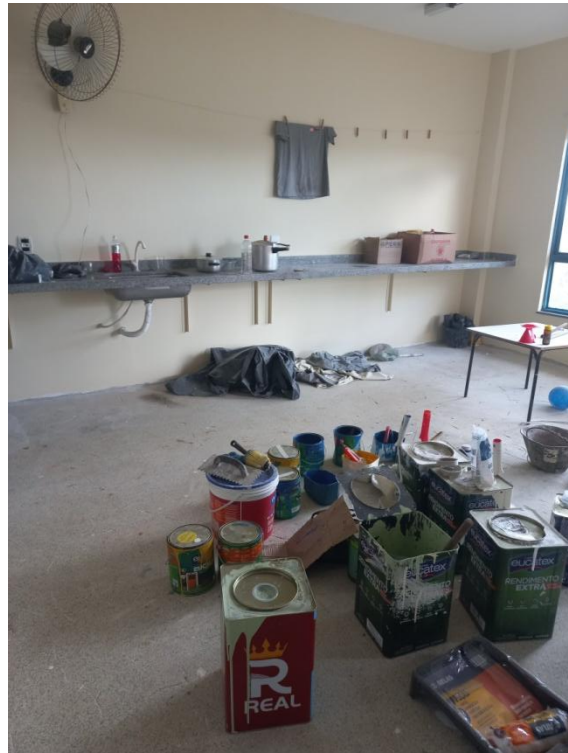









CARMO, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA
