

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

| | |
|---------------------------------|---|
| Data da vistoria: | 29/11/2022 |
| Obra: | Obra reforma da Creche Municipal Olga Ferreira Duarte |
| Endereço: | Rua Agostinho Lengruber, nº 420, Bairro Boa Ideia, no Município do Carmo-RJ |
| Empresa: | R.H, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ART ou RRT de Execução: | ART - 12435996 |
| Numero do contrato: | 0520/2022 |
| Numero da tomada de preço: | 0007/2022 |
| Numero da ordem de serviço: | 002/2022 |
| Prazo: | 04 meses |
| Início: | 26/09/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço) |
| Término: | 26/01/2023 |
| Valor: | R\$ 153.475,33 |
| Termos aditivos: | - |
| Valores Pagos: | R\$ 54.140,23 (Primeira Medição – 04/11/22) |
| Percentual executado: | 35,27% |
| Fiscal da Obra: | Gabriella Serrazina Pinheiro |
| Portaria de Nomeação de Fiscal: | PORTARIA Nº 309/2022 |
| ART ou RRT de Fiscalização: | RRT - 12600510 |
| Tipo de recurso: | Recurso Próprio / SME |


CARMO, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



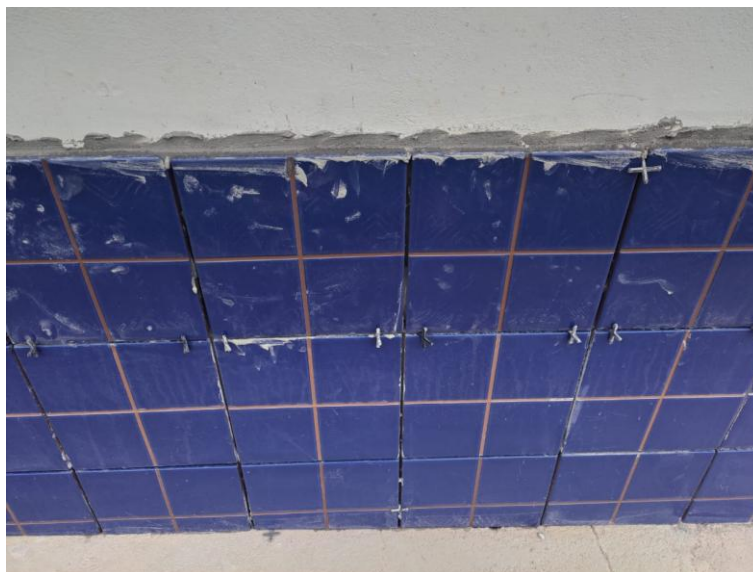








P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA

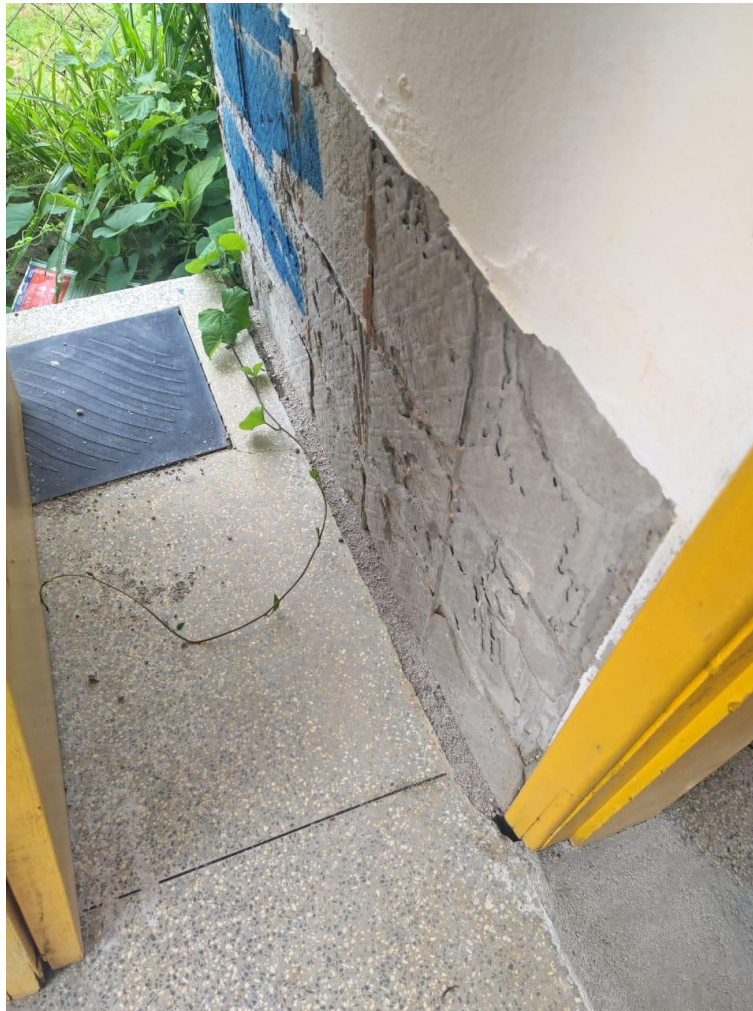



PREFEITURA
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA







P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**








P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA

















P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**





P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA









CARMO, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA
